AGERGS
Diagnóstico e Melhoria de Processos

Celebração de convênios e contratos de delegação da regulação

Diagnóstico do processo atual, boas práticas de outras agências e proposta de novo fluxo para a AGERGS

20	381	74,5 du	31 du
processos SEI analisados	documentos lidos	duração mediana hoje	meta com a fase 1

Porto Alegre, novembro de 2026
Documento de trabalho para validação com as unidades. Horas e custos são estimativas a calibrar.

Sumário

1. Resumo executivo.....
2. O processo e como ele foi analisado.....
3. Como o processo funciona hoje.....
4. Diagnóstico.....
4.1 Onde o tempo se perde.....
4.2 Os desperdícios, em linguagem Lean.....
4.3 Conformidade legal.....
4.4 Qualidade dos instrumentos.....
5. O que outras agências fazem.....
6. A proposta do processo SEI 002594-39.00/26-9.....
7. O novo processo proposto.....
7.1 Gatilhos, entradas, análises e saídas.....
7.2 Prazos internos sugeridos.....
8. Melhorias e ganhos esperados.....
9. Como acompanhar: indicadores e metas.....
10. Vale automatizar o processo inteiro?.....
11. Plano de implementação.....
Próximos passos de validação.....
Anexo — Processos analisados.....

1. Resumo executivo

Quando um município decide entregar à AGERGS a regulação do seu saneamento, começa um processo que deveria ser simples: reunir documentos, conferir a legalidade, assinar um instrumento e publicá-lo. Na prática, ele leva em mediana **74,5 dias úteis**, quase quatro meses, e alguns casos passam de um ano. Este relatório analisou 18 celebrações registradas no SEI entre 2013 e 2026 para entender por quê e propor um caminho melhor.

O que encontramos, em cinco frases

- **O tempo é espera, não trabalho.** Só 14,3% da duração tem algum documento sendo produzido; o trabalho estimado é de cerca de 8,6 horas por caso.
- **Não existe um processo, existem 18.** Cada um dos 18 casos seguiu um caminho diferente, com mediana de 7,5 passagens entre unidades e 2 retornos a etapas já feitas.
- **A espera é quase toda interna.** Só 14,6% do tempo parado é resposta do município ou do prestador. O resto se acumula depois da assinatura, na minuta, na publicação e em pedidos do município que esperam resposta.
- **A formalização tem lacunas.** A autorização formal antes da assinatura aparece em 16,7% dos casos, o parecer jurídico em 50% e a justificativa de inexigibilidade em 0% dos contratos.
- **Dá para reduzir o prazo à metade sem tecnologia nova.** Com o fluxo proposto, a duração mediana simulada cai para 31 dias úteis (−58,4%) só com organização, e para 24,6 (−67%) com automação.

O que propomos. Um fluxo único, com um dono (a DAI, como já indica a proposta do processo SEI 002594-39.00/26-9), um kit de adesão com documentação mínima, uma minuta padrão aprovada uma única vez com parecer jurídico referencial, prazos por etapa e publicação e comunicação em prazo fixo contado da assinatura. As medidas estão organizadas em três fases e acompanhadas de oito indicadores com metas.

2. O processo e como ele foi analisado

A Lei Federal 11.445/2007 permite que o município, titular do serviço de saneamento, delegue a regulação a uma agência. A Lei Estadual 16.266/2024 diz que a AGERGS regula serviços municipais delegados por **instrumento convenial ou contratual**. Esse instrumento é o produto do processo analisado aqui. Ao longo do tempo ele mudou de forma:

Forma	Período	Casos	Duração mediana	Característica
Convênio de delegação	2013–2020 e 2026	12	79,5 du	Pedido do prefeito, análise jurídica interna, minuta caso a caso
Contrato de prestação de serviços de regulação	2025–2026	5	15 du	Inexigibilidade (Lei 14.133, art. 74); parte da instrução fica em outro processo
Termo aditivo	2021	1	3 du	Inclusão de competência sancionatória

Como fizemos. Em vez de partir de entrevistas, reconstruímos o processo real a partir do que ficou registrado no SEI: os 381 documentos de 20 processos (as 18 celebrações e dois processos de gestão: o orientativo e o da minuta padrão). Cada documento recebeu uma ficha (quem fez, o quê, quando, com que esforço e com que problemas), e cada etapa foi medida em dias úteis a partir das datas de assinatura. Exigências legais foram conferidas contra o texto integral das normas. Todos os números saem de cálculo reprodutível; horas de trabalho e custos são estimativas a calibrar com os servidores.

Limites. Os PDFs exportados do SEI não trazem o histórico de tramitação, só os documentos. Por isso, a espera é medida entre documentos, e o que ocorreu fora do SEI (telefonemas, assinaturas em papel) não aparece. Com 18 casos, os números indicam ordem de grandeza e tendência, não estatística fina.

3. Como o processo funciona hoje

O desenho abaixo é o caminho mais comum, montado a partir dos 18 casos. A porcentagem em cada etapa mostra em quantos casos ela de fato aparece nos autos. As setas tracejadas mostram os retornos mais frequentes.

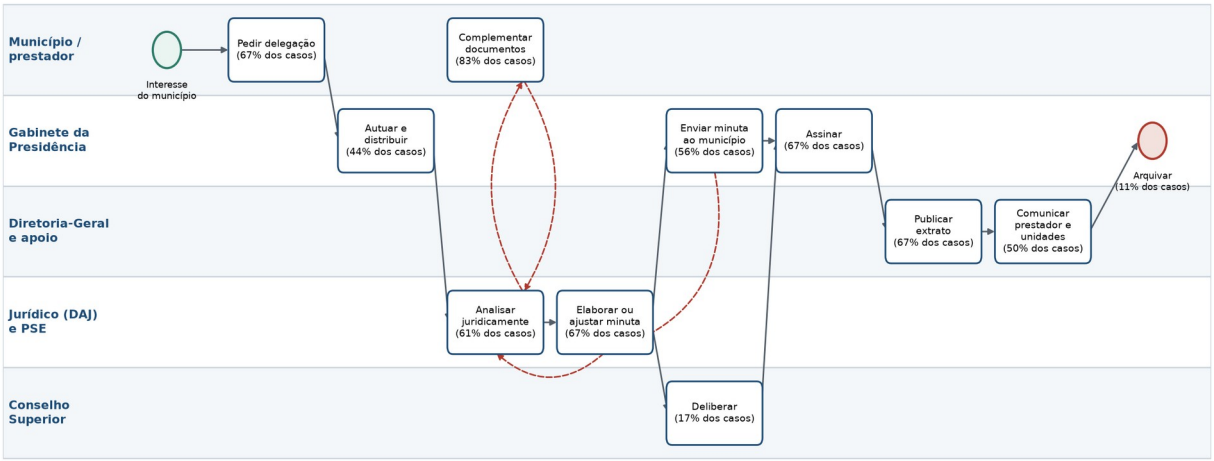


Figura 1 — Fluxo atual (AS-IS), com a frequência de cada etapa nos 18 casos

Três coisas saltam aos olhos:

- **Etapas centrais são opcionais na prática.** A deliberação do Conselho aparece em 16,7% dos casos e a autorização formal da Presidência ou da Diretoria-Geral em apenas 1 caso. Três contratos de 2025 chegaram ao processo já assinados.
- **A documentação chega em rodadas.** A complementação pelo município aparece em 15 casos, com repetição em 7. Termo de cooperação com o Estado e contrato de programa costumam chegar depois da minuta, às vezes depois da assinatura.
- **Análise jurídica e minuta vão e voltam.** A análise jurídica se repete em 8 casos e a minuta em 5. A oitiva do prestador aparece em só 3 casos, mas soma 17 rodadas; Passo Fundo, sozinho, acumulou 64 passagens entre unidades.

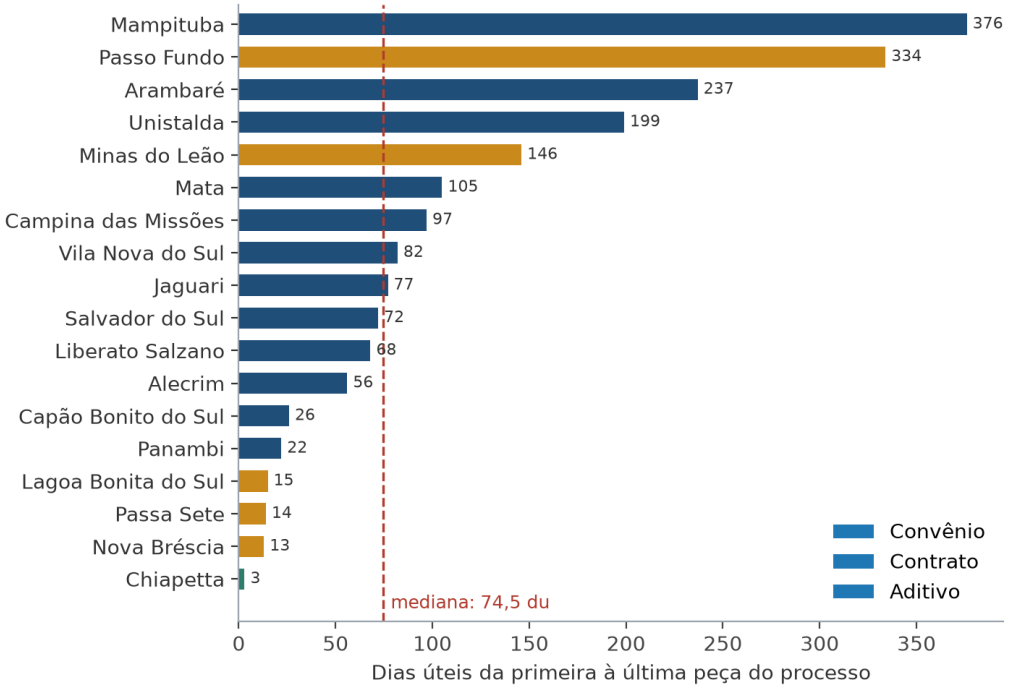


Figura 2 — Duração de cada celebração, em dias úteis

4. Diagnóstico

4.1 Onde o tempo se perde

A mediana esconde uma cauda longa: metade dos casos termina em até 74,5 du, mas um quarto passa de 135,8 du, e o máximo chega a 376 du. Quando se soma toda a espera dos 18 casos e se pergunta **antes de qual etapa** o processo ficou parado, a resposta é clara:

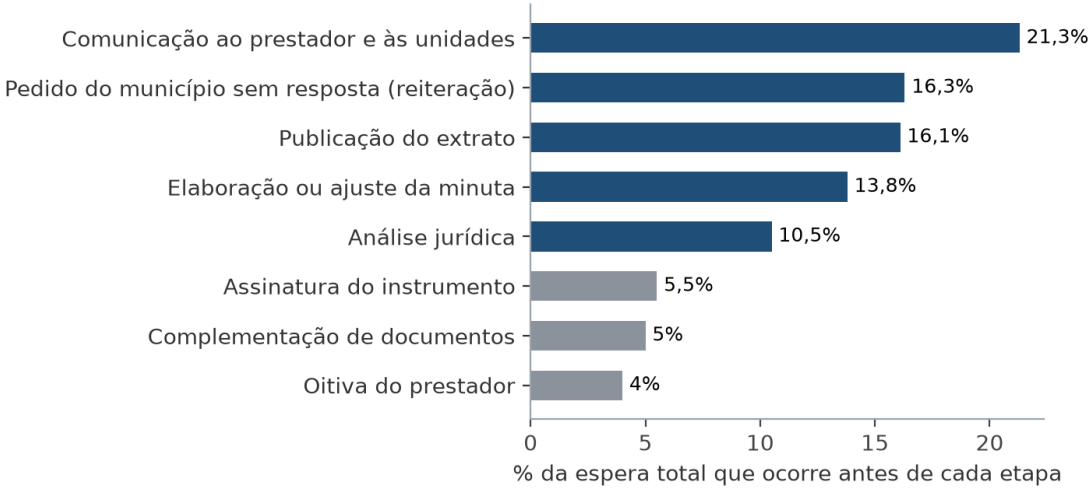


Figura 3 — Em que ponto do fluxo a espera se acumula

A maior fila está **depois da assinatura**: comunicar o prestador e as unidades (21,3%) e publicar o extrato (16,1%) somam 37,4% dos dias parados. Logo em seguida vem algo pouco visível: **pedidos do município que esperam resposta até ele reiterar** (16,3%). Em Unistalda, o pedido de 2018 só foi reiterado em 2019, e o processo ainda aguarda a AGERGS.

4.2 Os desperdícios, em linguagem Lean

Desperdício	Como aparece no processo	Gravidade
Espera	Execução cobre 14,3% do prazo; eficiência do ciclo de 1,7%	Alta
Transporte	Mediana de 7,5 passagens e 3 encaminhamentos sem conteúdo por caso	Alta
Retrabalho	Mediana de 2 retornos por caso (máximo de 33); erros materiais repetidos (ano da Lei 11.445, foro, número da lei municipal, CNPJ); súmula publicada antes da assinatura, com errata	Alta
Superprocessamento	Cada minuta é redigida do zero ou copiada do último caso; cláusulas divergem entre contratos (fundamento legal, vigência, rescisão, custeio)	Média
Movimentação	Documentos pedidos em várias rodadas, sem lista mínima na entrada	Média
Estoque	5 casos assinados sem publicação nos autos e 2 aguardando a AGERGS; arquivamento formal raro	Média

4.3 Conformidade legal

Dez requisitos foram tirados do texto literal da Lei 11.445/2007, da Lei 14.133/2021 e das Leis Estaduais 16.266/2024 e 15.612/2021. Oito deles podem ser testados nos autos:

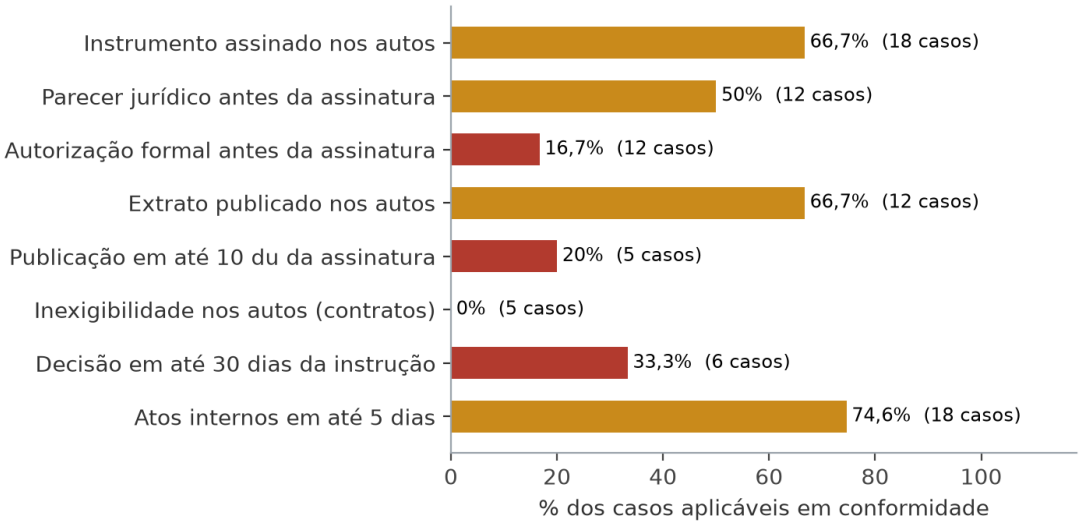


Figura 4 — Quanto da exigência legal está nos autos

O quadro não indica ilegalidade. Indica **instrução incompleta ou dispersa**: atos que provavelmente existiram (autorização, inexigibilidade, publicação), mas em outro processo, em papel ou sem juntada. A publicação em até 10 dias úteis da assinatura, prevista no art. 94 da Lei 14.133, é cumprida em 20% dos casos aplicáveis. Em um caso, a súmula saiu antes da assinatura e precisou de errata.

4.4 Qualidade dos instrumentos

A comparação entre contratos assinados, feita no processo da minuta padrão (SEI 002840-39.00/26-3), e a leitura dos 18 casos mostram textos que mudam de um município para outro sem motivo registrado: fundamento legal (art. 74 da Lei 14.133 ou art. 8° da Lei 11.445), vigência (60 meses ou atrelada à concessão), hipóteses de rescisão e periodicidade do custeio. Aparecem também erros que se propagam por cópia: "Lei n. 11.445/2027", foro de outro município, "Município de Xxx", número de lei municipal divergente e CNPJ trocado.

5. O que outras agências fazem

Uma pesquisa rápida em agências reguladoras, na ANA e em órgãos de controle mostrou práticas que respondem diretamente aos problemas encontrados:

Quem	Prática	Problema que resolve
ANA — NR 4/2024	Ato de delegação com 4 elementos mínimos: atribuições com poder fiscalizatório, escopo, deveres das partes e origem dos recursos. Comprovação anual da agência à ANA	Instrumentos diferentes entre si
AGEPAR (PR)	Guia para novos convênios; pedido do prefeito só por protocolo eletrônico; minuta sugestiva anexa a uma resolução	Documentação em rodadas; minuta caso a caso
AGU e PGE-PR	Minutas-padrão com parecer jurídico referencial e lista de verificação: a análise individual só confere o enquadramento	Análise jurídica repetida
ARES-PCJ (SP)	Concessionária assina como interveniente e paga a taxa; vigência acompanha a concessão; rescisão só com contraditório	Negociação longa com o prestador
AGIR e ARIS (SC)	Rito de adesão escrito: pedido formal, aprovação em assembleia, lei de ratificação que já institui a taxa	Falta de rito e de critério de decisão
AGR-GO	Lei municipal autorizativa como entrada; publicação em até 30 dias e comunicação à Câmara Municipal	Publicação sem prazo
ARSAE-MG	Lei estadual fixa o conteúdo mínimo do convênio	Cláusulas divergentes
SEI (usuário externo)	Assinatura eletrônica do prefeito no próprio processo	Assinatura em papel, fora dos autos

Nenhuma das fontes publica a redução de prazo obtida com essas práticas. Por isso, os ganhos deste relatório são simulações sobre os casos da AGERGS, não promessas importadas de outro lugar.

6. A proposta do processo SEI 002594-39.00/26-9

A própria AGERGS já deu o primeiro passo. O processo orientativo propõe um procedimento institucional único para todos os instrumentos de cooperação, delegação e parceria, em **11 etapas**, com a DAI como coordenadora institucional desde a origem nos casos de delegação da regulação. O diagnóstico confirma o problema que ela aponta: não há fluxo formal, e as competências indefinidas geram retrabalho.

Etapa proposta	Responsável	O diagnóstico recomenda
1. Necessidade, abertura e instrução inicial	Unidade proponente / DAI	Formulário de adesão e checklist mínimo na abertura
2. Articulação, objeto e coleta documental	DAI	Diligência única, com prazo, em vez de rodadas
3. Análise técnica e de viabilidade	Unidade técnica	Em paralelo à minuta e à oitiva do prestador
4. Validação institucional pela DG	DG	Pode ser dispensada quando o caso segue a minuta padrão
5. Estruturação jurídica (PSE)	PSE	Parecer referencial sobre a minuta padrão; análise só dos desvios
6. Definição do rito decisório	GP	Critério escrito: Presidência sem desvio, Conselho com desvio relevante
7. Deliberação	Presidência ou CS	Autorização e inexigibilidade sempre nos autos
8. Formalização e assinatura	DAI	Assinatura eletrônica do prefeito no SEI
9. Publicação e comunicação	DG	Prazo de 10 du da última assinatura; comunicado único
10. Implantação	DG	Cadastro do município e envio de informações à ANA
11. Monitoramento, alteração e encerramento	DAI	Plano de trabalho anual; aditivos pela mesma minuta

O que falta na proposta, segundo o próprio processo e o diagnóstico:

- **Prazos por etapa.** O único prazo citado é o de 15 dias úteis para as unidades se manifestarem sobre a proposta.
- **Checklist por tipo de instrumento.** A lista de documentos é indicativa ("poderão ser solicitados").
- **Critério objetivo** para levar o caso à Presidência ou ao Conselho Superior.
- **Ajustes de redação:** a DG aparece como executora nas etapas 4, 9 e 10, embora o texto diga que ela não deve executar; o escopo da DSI diverge entre a justificativa e o anexo; o regramento da deliberação cita a etapa 8 quando é a 7.
- **Manifestações pendentes:** a DTM pediu prazo adicional, e as demais unidades ainda não se manifestaram nos autos.

A proposta é um bom guarda-chuva para todos os instrumentos da agência. Para a delegação da regulação, que é o caso mais frequente e mais padronizável, sugerimos um **rito simplificado dentro dela**, descrito a seguir.

7. O novo processo proposto

O novo fluxo segue a lógica "padrão primeiro, exceção depois": tudo o que pode ser decidido uma vez (documentos exigidos, texto do instrumento, parecer jurídico) é decidido uma vez, e cada caso só discute o que foge do padrão.

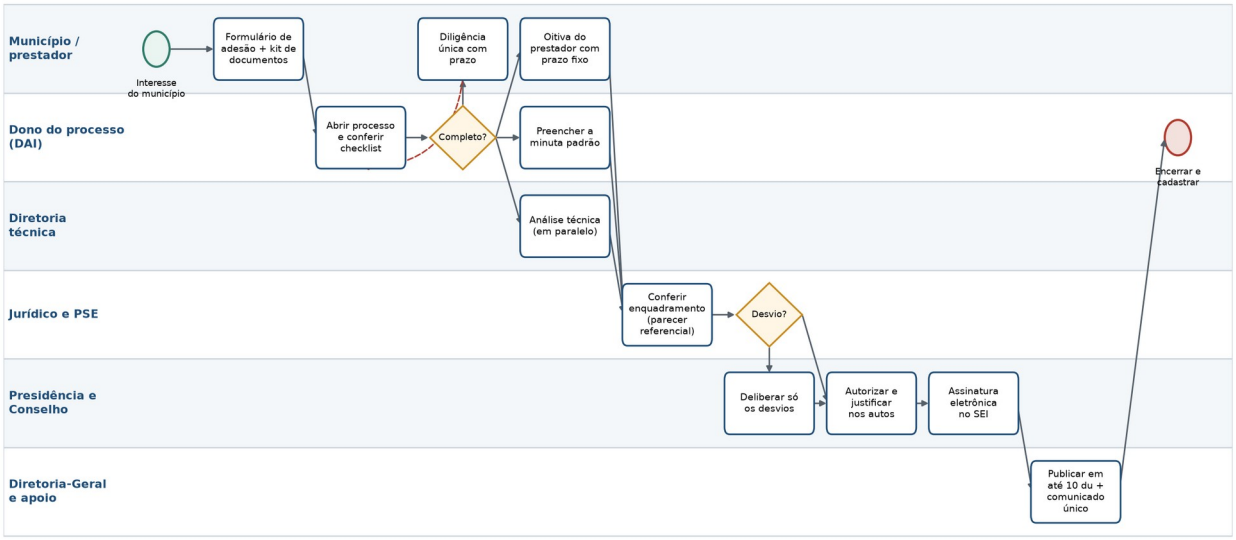


Figura 5 — Fluxo proposto (TO-BE)

7.1 Gatilhos, entradas, análises e saídas

Elemento	Como fica
Gatilhos de início	Pedido formal do prefeito pelo formulário de adesão; lei autorizativa já aprovada; nova concessão ou novo contrato de programa; necessidade de ajustar competências (aditivo)
Entradas (kit mínimo)	Manifestação do titular com serviços e prestador; lei autorizativa; contrato de concessão ou de programa; PMSB, se houver; regulação anterior por outra entidade; parecer do conselho municipal de saneamento, se existir; cadastro do prefeito como usuário externo do SEI
Análises	Admissibilidade (checklist, pela DAI); técnica (escopo e prestador, em paralelo); jurídica (enquadramento no parecer referencial e desvios); econômico-financeira (taxa de regulação e quem paga); oitiva do prestador, uma vez e com prazo; aderência aos 4 elementos da NR 4 da ANA
Decisão	Presidência quando o caso segue a minuta padrão; Conselho Superior quando há desvio relevante; autorização e justificativa da inexigibilidade sempre nos autos

Elemento	Como fica
Saídas	Instrumento assinado eletronicamente; extrato publicado em até 10 du da última assinatura; comunicado único ao prestador, à Câmara Municipal e às unidades; cadastro do município regulado; plano de trabalho anual de fiscalização

7.2 Prazos internos sugeridos

Os prazos seguem a Lei Estadual 15.612/2021, que fixa 5 dias para atos sem prazo próprio (prorrogáveis ao dobro) e 30 dias para decidir após concluída a instrução:

Etapa	Prazo sugerido	Contagem
Conferência do checklist e diligência única	5 du	Do recebimento do formulário
Resposta do município à diligência	Prazo fixado no ofício (tempo do município)	Protegido: não é cortado
Análise técnica, minuta e oitiva do prestador (em paralelo)	10 du	Do checklist completo
Conferência jurídica do enquadramento	5 du (10 du se houver desvio)	Da minuta preenchida
Decisão (Presidência ou Conselho)	Até 30 dias	Da instrução concluída
Publicação do extrato	10 du	Da última assinatura
Comunicado único e encerramento	5 du	Da publicação

8. Melhorias e ganhos esperados

As 12 melhorias estão em três fases cumulativas. A fase 1 muda só a organização; a fase 2 automatiza regras e documentos; a fase 3 usa inteligência artificial para conferir e redigir, sempre com revisão de um servidor.

Fase	Melhoria	O que muda
Fase 1	Kit de adesão com checklist único de documentos mínimos	Formulário de adesão e checklist (manifestação formal, serviços, prestador, contrato de programa ou concessão, lei autorizativa, PMSB, regulação anterior) exigidos na entrada.
Fase 1	Minuta padrão única aprovada previamente	Minuta padrão de contrato de regulação aprovada pela PSE e pelo Conselho Superior.
Fase 1	Parecer jurídico referencial sobre a minuta padrão	Manifestação jurídica referencial (DAJ e PSE) sobre a minuta padrão.
Fase 1	Dono do processo e prazo interno por etapa	A DAI (proposta do processo orientativo) conduz a celebração do pedido ao arquivamento.
Fase 1	Publicação do extrato em prazo contado da última assinatura	Extrato publicado só depois da última assinatura e em até 10 dias úteis dela, com a publicação juntada ao processo.
Fase 1	Comunicado único pós-assinatura e encerramento em prazo fixo	Um comunicado com lista de distribuição padrão (prestador, DAF, diretorias técnicas, DTI, DAU) no dia da publicação.
Fase 2	Painel de prazos e alertas da celebração	Painel com a idade de cada processo por etapa e unidade, prazo dado ao município e ao prestador e processo sem movimentação.
Fase 2	Documentos por modelo: extrato, comunicados, ofícios e termo de encerramento	Modelos SEI com campos preenchidos a partir dos dados do processo (município, serviço, prestador, número e data do instrumento).
Fase 2	Assinatura eletrônica do prefeito como usuário externo do SEI	Liberação de assinatura externa no SEI para o prefeito, com acompanhamento automático.
Fase 3	Conferência da documentação do município por IA	Extração dos dados da lei autorizativa, do contrato com o prestador e do PMSB e conferência contra o checklist, com lista de pendências para a diligência única.
Fase 3	Minuta assistida e checagem de erros materiais	Geração da minuta a partir da padrão e verificação de cláusulas obrigatórias, fundamento legal, ano das leis, foro e identificação do município.

Fase	Melhoria	O que muda
Fase 3	Pré-análise jurídica e relatório ao relator assistidos	Pré-análise dos requisitos (lei autorizativa, fundamento, escopo, prestador, desvios da minuta padrão) e relatório do caso para o relator do Conselho, com citação verificada.

Para estimar o ganho, cada melhoria foi aplicada aos 18 casos reais em três cenários (conservador, esperado e otimista), sem cortar o tempo de resposta do município e do prestador:

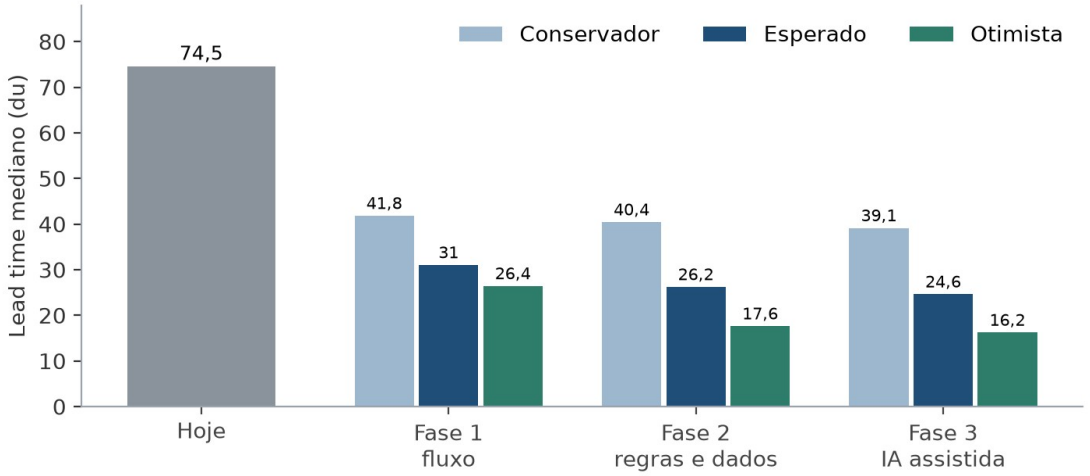


Figura 6 — Duração mediana simulada por fase e cenário (dias úteis)

	Hoje	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Duração mediana (du), cenário esperado	74,5	31	26,2	24,6
Redução da duração	—	−58,4%	−64,8%	−67%
Faixa de redução (conservador a otimista)	—	−43,9% a −64,6%	−45,8% a −76,4%	−47,5% a −78,3%
Horas de trabalho por caso (mediana, estimativa)	8,6	6,5	5,9	5,1

A maior parte do ganho vem da **fase 1**. Entre as medidas, as que mais pesam são o comunicado único pós-assinatura, a publicação em prazo fixo, o kit de adesão e os prazos internos por etapa. A IA reduz sobretudo horas de trabalho, que já são poucas, e quase não mexe no prazo.

9. Como acompanhar: indicadores e metas

Cada meta vem da simulação (fases 1 a 3) ou da própria lei (100%). Os indicadores podem ser apurados a partir do SEI, de preferência num painel mensal.

Indicador	Hoje	Meta fase 1	Meta fase 3	Responsável
Lead time da celebração	74,5 du	31 du	24,6 du	DAI
Divulgação do extrato em até 10 dias úteis da assinatura	20%	40%	40%	DG
Decisão em até 30 dias após a instrução	33,3%	66,7%	83,3%	GP
Atos internos em até 5 dias	74,6%	79,7%	84%	DAI
Horas de trabalho por celebração	8,6 h	6,5 h	5,1 h	DAI
Retornos por caso (qualidade)	2 retornos	acompanhar	acompanhar	DAJ
Parecer jurídico antes da assinatura	50%	100%	100%	DAJ

Indicador	Hoje	Meta fase 1	Meta fase 3	Responsável
Instrução completa no processo de celebração	0%	100%	100%	GP

A publicação em até 10 du não chega a 100% na simulação porque parte da espera é a assinatura do município. Chegar lá depende da assinatura eletrônica no SEI e de prazo para o município assinar. O indicador de retornos por caso serve de contrapeso: prazo menor não pode virar mais retrabalho.

10. Vale automatizar o processo inteiro?

Ainda não. Pelos critérios de priorização da metodologia (volume, peso das análises, dados, regras claras, padronização e completude), o processo obtém nota **60 de 100**. O processo indicado como piloto no caso de referência obteve 80. Três condições para um piloto de automação completa não são atendidas: volume anual baixo, fluxo ainda não padronizado e nenhum caminho que se repita. Na estimativa (hipótese), um sistema dedicado custaria cerca de R$ 136.680 para devolver R$ 2.517 por ano em horas.

A recomendação é **padronizar primeiro (fases 1 e 2)** e usar IA em tarefas pontuais e reaproveitáveis em outros processos da agência: conferência de documentos contra checklist, minuta a partir do padrão com checagem de erros materiais e pré-análise jurídica, sempre com revisão humana.

11. Plano de implementação

Quando	O que fazer	Quem
0 a 3 meses	Concluir o processo orientativo com o rito simplificado da delegação; aprovar a minuta padrão e o parecer referencial; publicar o formulário e o checklist; definir a DAI como dona do processo; criar tipo de processo SEI próprio	GP, DAI, PSE, Conselho Superior
3 a 6 meses	Prazos internos em vigor; modelos SEI de ofício, extrato, comunicado e termo de encerramento; assinatura eletrônica do prefeito como usuário externo; primeiro painel de indicadores	DAI, DG, DTI
6 a 12 meses	Painel com alertas de prazo e de pedido sem resposta; integração com a comprovação anual à ANA; piloto de conferência de documentos e de minuta assistidas, com controle de qualidade	DAI, DTI, DAJ
Contínuo	Revisão trimestral dos indicadores; calibração das horas com as unidades; atualização da minuta padrão quando a ANA ou a lei mudarem	DAI e unidades

Decisões que dependem da gestão

- Confirmar a DAI como dona do processo de delegação e alinhar as atribuições com DSI e DTM.
- Definir o instrumento-padrão (convênio de cooperação ou contrato com inexigibilidade), com manifestação da PSE.
- Aprovar a minuta padrão e o critério de quando o caso vai ao Conselho Superior.
- Decidir se a AGERGS publicará um guia de adesão para os municípios, como fazem outras agências.

Próximos passos de validação

- Validar com as unidades os rótulos das etapas: a conferência independente concordou em 81,6% das 97 peças auditadas, abaixo da meta de 85%.
- Conferir no DOE-RS os textos das Leis Estaduais 16.266/2024 e 15.612/2021 usados nos requisitos.
- Informar o número real de celebrações por ano e o custo-hora, hoje estimados.

- Localizar os processos de inexigibilidade e os TAAC dos contratos de 2025, que estão fora dos autos analisados.

Anexo — Processos analisados

Município	Processo SEI	Instrumento	Início	Duração (du)	Docs.	Situação nos autos
Alecrim	13.3900.00759-4	Convênio	2013	56	8	Assinado, sem publicação nos autos
Campina das Missões	000067-39.00/16-9	Convênio	2016	97	9	Assinado, sem publicação nos autos
Panambi	000771-39.00/18-8	Convênio	2018	22	13	Assinado, sem publicação nos autos
Salvador do Sul	001086-39.00/18-3	Convênio	2018	72	13	Assinado e publicado
Unistalda	001283-39.00/18-1	Convênio	2018	199	12	Aguardando a AGERGS
Mampituba	000212-39.00/19-7	Convênio	2019	376	38	Aguardando o município
Mata	000734-39.00/19-7	Convênio	2019	105	21	Assinado e publicado
Liberato Salzano	000765-39.00/19-5	Convênio	2019	68	12	Assinado e publicado
Jaguari	000972-39.00/19-5	Convênio	2019	77	13	Assinado e publicado
Vila Nova do Sul	001132-39.00/19-0	Convênio	2019	82	17	Assinado e publicado
Arambaré	001470-39.00/19-6	Convênio	2019	237	17	Assinado, sem publicação nos autos
Chiapetta	000802-39.00/21-6	Aditivo	2021	3	6	Assinado e publicado
Lagoa Bonita do Sul	000684-39.00/25-2	Contrato	2025	15	5	Assinado e publicado
Passa Sete	000495-39.00/25-0	Contrato	2025	14	5	Assinado, sem publicação nos autos
Nova Bréscia	000681-39.00/25-4	Contrato	2025	13	10	Assinado e publicado
Passo Fundo	001165-39.00/25-8	Contrato	2025	334	99	Assinado e publicado
Minas do Leão	002063-39.00/25-1	Contrato	2025	146	43	Assinado e publicado
Capão Bonito do Sul	002718-39.00/26-1	Convênio	2026	26	17	Aguardando a AGERGS

Duração: dias úteis da primeira à última peça datada do processo. Também foram analisados os processos SEI 002594-39.00/26-9 (processo orientativo) e 002840-39.00/26-3 (minuta padrão).
